

Kurva-S — Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Status kesiapan sebelum mobilisasi & pemasangan fisik GLD di RU IV Cilacap, per kategori kerja dan per pihak (LGU & ITB, Pertamina RU IV, Vendor Instalasi). Ini bukan Kurva-S proyek keseluruhan 9 bulan — cakupannya khusus tahap persiapan instalasi Cilacap.

REV 1.0 • 18 SEPTEMBER 2026

STATUS: PRA-MOBILISASI

LGU & ITB

100%

15 dari 15 item persiapan siap/selesai

PERTAMINA RU IV

0%

14 item — dokumen & infrastruktur dalam proses

VENDOR INSTALASI

0%

11 item — menunggu penugasan resmi

KESELURUHAN


38%

15 dari 40 item lintas 3 pihak

Catatan penting soal angka 100% LGU & ITB: angka ini mencakup desain, unit, dokumen kerja, dan kesiapan teknis — **bukan perizinan**. Seluruh proses perizinan (pengesahan TRA/JSA, izin kerja, izin masuk personel, dan surat masuk barang ke area RU IV) sepenuhnya berada di wewenang dan tanggung jawab Pertamina RU IV, tercakup dalam angka 0/14 di kolom Pertamina RU IV — bukan bagian dari 15 item LGU.

Tren persiapan (keseluruhan)

Dihitung dari checklist kerja bersama 3 pihak. Baru ada 2 titik data yang bisa dipertanggungjawabkan: saat checklist pertama disusun (10 Sep) dan hari ini (18 Sep) — belum ada pengukuran harian di antaranya, jadi garis di bawah ini menghubungkan dua titik nyata, bukan tren presisi harian.

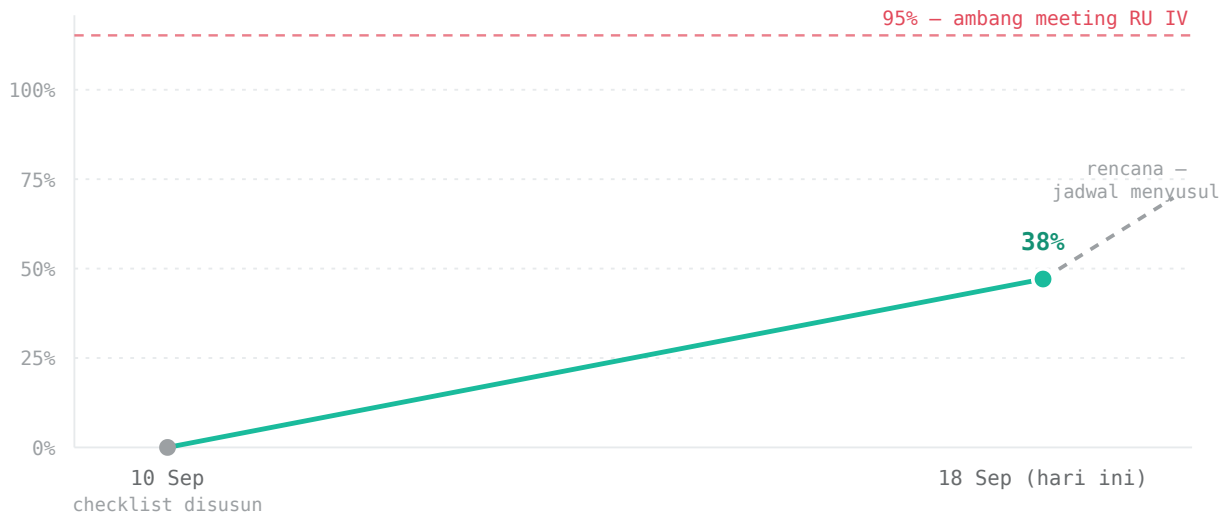

- Aktual (keseluruhan, gabungan 3 pihak)
- Proyeksi arah (belum bertanggal pasti)
- Ambang meeting lanjutan RU IV (>95%, disebut Pertamina 18 Sep)

Breakdown per kategori & pihak

Jumlah item persiapan yang sudah selesai/siap dibanding total item pada kategori tsb, per pihak. Rincian penuh per item ada di dokumen "Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap" (17 Sep).

KATEGORI	LGU & ITB	PERTAMINA RU IV	VENDOR INSTALASI
1. Lokasi & klasifikasi area	2/2	0/2	0/2
2. Dokumen, izin & K3	2/2	0/4	0/3
3. Perangkat, mekanik & bracket	3/3	0/2	0/3
4. Catu daya & kabel	2/2	0/2	0/2
5. Jaringan & server	3/3	0/2	—
6. Koordinasi & commissioning hari-H	3/3	0/2	0/1
Total	15/15	0/14	0/11

Langkah berikutnya: pengesahan TRA/JSA spesifik titik pasang, penugasan resmi vendor instalatur oleh Pertamina RU IV, dan penyediaan infrastruktur di lokasi (titik catu daya, PC server, akses struktur) — ketiganya berada di sisi Pertamina RU IV & vendor. Dari sisi LGU, seluruh item persiapan yang menjadi tanggung jawab kami sudah selesai. Kami usulkan meeting online bersama vendor instalatur dan RU IV untuk menyepakati jadwal dan menutup item-item ini bersama.

Dokumen ini merangkum "Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap" (17 Sep 2026) dan "Checklist Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap" (10 Sep 2026). Bukan izin kerja, sertifikat, atau pengganti persetujuan HSE/operasi Pertamina. Instalasi permanen di area berbahaya tetap menunggu gate keselamatan & sertifikasi terkait.
