

Kurva-S — Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Status kesiapan sebelum mobilisasi & pemasangan fisik GLD di RU IV Cilacap, per kategori kerja dan per pihak (LGU & ITB, Pertamina RU IV, Vendor Instalasi). Ini bukan Kurva-S proyek keseluruhan 9 bulan — cakupannya khusus tahap persiapan instalasi Cilacap.

REV 1.0 • 18 SEPTEMBER 2026

STATUS: PRA-MOBILISASI

LGU & ITB

100%

15 dari 15 item persiapan siap/selesai

PERTAMINA RU IV

0%

14 item — dokumen & infrastruktur dalam proses

VENDOR INSTALASI

0%

11 item — menunggu penugasan resmi

KESELURUHAN


38%

15 dari 40 item lintas 3 pihak

Catatan penting soal angka 100% LGU & ITB: angka ini mencakup desain, unit, dokumen kerja, dan kesiapan teknis — **bukan perizinan**. Seluruh proses perizinan (pengesahan TRA/JSA, izin kerja, izin masuk personel, dan surat masuk barang ke area RU IV) sepenuhnya berada di wewenang dan tanggung jawab Pertamina RU IV, tercakup dalam angka 0/14 di kolom Pertamina RU IV — bukan bagian dari 15 item LGU.

Tren persiapan (keseluruhan)

Dihitung dari checklist kerja bersama 3 pihak. Baru ada 2 titik data yang bisa dipertanggungjawabkan: saat checklist pertama disusun (10 Sep) dan hari ini (18 Sep) — belum ada pengukuran harian di antaranya, jadi garis di bawah ini menghubungkan dua titik nyata, bukan tren presisi harian.

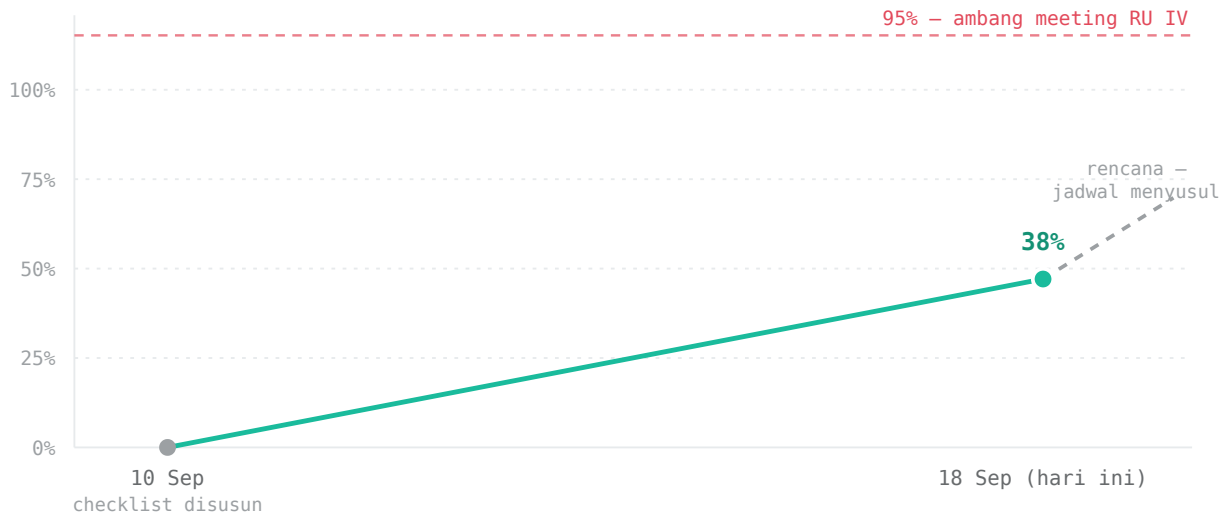

- Aktual (keseluruhan, gabungan 3 pihak)
- Proyeksi arah (belum bertanggal pasti)
- Ambang meeting lanjutan RU IV (>95%, disebut Pertamina 18 Sep)

Breakdown per kategori & pihak

Jumlah item persiapan yang sudah selesai/siap dibanding total item pada kategori tsb, per pihak. Rincian penuh per item ada di dokumen "Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap" (17 Sep).

KATEGORI	LGU & ITB	PERTAMINA RU IV	VENDOR INSTALASI
1. Lokasi & klasifikasi area	2/2	0/2	0/2
2. Dokumen, izin & K3	2/2	0/4	0/3
3. Perangkat, mekanik & bracket	3/3	0/2	0/3
4. Catu daya & kabel	2/2	0/2	0/2
5. Jaringan & server	3/3	0/2	—
6. Koordinasi & commissioning hari-H	3/3	0/2	0/1
Total	15/15	0/14	0/11

Rincian per item (40 item)

Daftar lengkap item yang menjadi dasar perhitungan di atas. Metodologi: item dihitung **selesai** bila status tertulis SELESAI/TERSEDIA/SIAP/SUDAH; selain itu dihitung **belum**. Sumber: "Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap" (17 Sep 2026).

#	ITEM	PIHAK	STATUS	
1. LOKASI & KLASIFIKASI AREA				
1	Basis desain mounting bracket (L-bracket + U-bolt 2"/DN50), non-invasive — tanpa bor/las	LGU	SELESAI	selesai
2	Gambar CAD (STEP/OBJ) diserahkan ke vendor sbg acuan fabrikasi	LGU	SELESAI	selesai
3	Dokumen klasifikasi area tertulis resmi (perimeter SRU)	RU IV	DALAM PROSES	belum
4	Penetapan titik pasang detail per unit, rute kabel & tinggi kerja	RU IV	SURVEY ADA, DETAIL BELUM DIKUNCI	belum
5	Verifikasi lapangan & shop drawing titik pasang	Vendor	MENUNGGU PENUGASAN	belum
6	Konfirmasi orientasi bracket (tiang vertikal vs handrail horizontal)	Vendor	BELUM DIKONFIRMASI	belum
2. DOKUMEN, IZIN & KESELAMATAN KERJA				
7	Draft JSA/HSE sbg acuan awal (belum menggantikan TRA/JSA resmi)	LGU	TERSEDIA (DRAFT)	selesai*
8	Checklist kesiapan instalasi lengkap sbg referensi kerja bersama	LGU	TERSEDIA	selesai
9	Pengesahan TRA/JSA spesifik titik pasang	RU IV	BELUM DISAHKAN	belum
10	Izin kerja, izin masuk personel & surat masuk barang	RU IV	WAJIB SEBELUM MOBILISASI	belum
11	Penugasan resmi vendor pelaksana & konfirmasi kompetensi kerja tinggi	RU IV	PERLU PENUGASAN	belum
12	Daftar kontak PIC (operasi/HSE/control room/IT) & jalur stop-work	RU IV	PERLU DIISI	belum
13	Personel bersertifikasi kerja di ketinggian & metode kerja aman	Vendor	MENUNGGU PENUGASAN RESMI	belum
14	Toolbox meeting, APD, LOTO, gas test, koordinasi control room	Vendor	PERLU RENCANA KERJA	belum
15	Partisipasi dalam pengesahan TRA/JSA sbg pelaksana fisik	Vendor	MENUNGGU	belum

3. PERANGKAT, MEKANIK & BRACKET

16	Unit GLD (3 RU IV + 1 cadangan), firmware & AI on-device	LGU	SIAP, VERIFIKASI PRA-MOBILISASI	selesai*
17	Spesifikasi bracket/U-bolt/fastener sudah diberikan ke vendor	LGU	SELESAI	selesai
18	Supervisi teknis/QA selama pemasangan fisik	LGU	SIAP DILAKSANAKAN	selesai
19	Menyetujui metode mounting non-invasive pada struktur existing	RU IV	MENUNGGU KONFIRMASI	belum
20	Menyediakan akses ke struktur existing titik pasang	RU IV	TERGANTUNG SURVEY DETAIL	belum
21	Fabrikasi & pemasangan fisik bracket	Vendor	MENUNGGU PENUGASAN	belum
22	Menyediakan alat kerja, kunci, dan fastener sesuai spesifikasi	Vendor	DETAIL FASTENER TERBUKA	belum
23	Melaksanakan pemasangan fisik GLD & Cluster Head	Vendor	BELUM DAPAT DIMULAI	belum

4. CATU DAYA & KABEL

24	Spesifikasi catu daya 24VDC $\geq 1A$ per unit GLD sudah ditetapkan	LGU	SELESAI	selesai
25	Terminasi elektrik spesifik-GLD, energize, dan commissioning	LGU	SIAP DILAKSANAKAN	selesai
26	Menyediakan titik catu daya 24VDC di lokasi pasang	RU IV	PERLU KONFIRMASI TITIK	belum
27	Menyediakan jalur kabel dari sumber daya ke titik pasang	RU IV	MENUNGGU KONFIRMASI	belum
28	Instalasi fisik jalur kabel, terminasi mekanik & identifikasi kabel	Vendor	MENUNGGU PENUGASAN	belum
29	Menerapkan LOTO selama pekerjaan instalasi kabel & catu daya	Vendor	MENUNGGU RENCANA KERJA	belum

5. JARINGAN & SERVER

30	Setup PC server, MQTT broker, adapter MQTT→backend, dan dashboard	LGU	SIAP DIKONFIGURASI	selesai
----	---	-----	--------------------	---------

31	Router LGU sendiri di lokasi — jaringan field berjalan independen	LGU	SUDAH DIRANCANG	selesai
32	Uji lokal & acceptance test sebelum serah terima	LGU	CHECKLIST HARI-H DISIAPKAN	selesai
33	Menyediakan PC dedicated fisik dekat Gateway	RU IV	MENUNGGU PENGADAAN	belum
34	Review keamanan IT bila dashboard dibuka ke intranet kantor (NIC kedua)	RU IV	REVIEW FORMAL TERBUKA	belum
6. KOORDINASI & COMMISSIONING HARI-H				
35	Memimpin energize & uji fungsional bersama HSE/control room	LGU	SIAP DILAKSANAKAN	selesai
36	Menyusun kriteria acceptance test (telemetry, alarm/clear, rollback)	LGU	SUDAH DISUSUN	selesai
37	Menyerahkan log commissioning, konfigurasi akhir & foto titik pasang	LGU	SIAP DILAKSANAKAN	selesai
38	Menyediakan PIC operasi/HSE/control room saat hari-H	RU IV	PERLU DIISI	belum
39	Menyetujui rencana energize & menandatangani berita acara commissioning	RU IV	MENUNGGU JADWAL	belum
40	Hadir sbg pelaksana fisik hari-H, dikoordinasikan LGU/HSE	Vendor	MENUNGGU PENUGASAN	belum

* Item #7 (JSA) dan #16 (unit GLD) dihitung selesai dari sisi LGU, tapi masing-masing masih menyisakan syarat di pihak lain: #7 masih berstatus draft, menunggu pengesahan resmi RU IV (item #9); #16 masih perlu verifikasi pra-mobilisasi (cek serial number/firmware/kondisi fisik) sebelum keberangkatan.

Langkah berikutnya: pengesahan TRA/JSA spesifik titik pasang, penugasan resmi vendor instalatur oleh Pertamina RU IV, dan penyediaan infrastruktur di lokasi (titik catu daya, PC server, akses struktur) — ketiganya berada di sisi Pertamina RU IV & vendor. Dari sisi LGU, seluruh item persiapan yang menjadi tanggung jawab kami sudah selesai. Kami usulkan meeting online bersama vendor instalatur dan RU IV untuk menyepakati jadwal dan menutup item-item ini bersama.

Dokumen ini merangkum "Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap" (17 Sep 2026) dan "Checklist Kesiapan Instalasi RU IV Cilacap" (10 Sep 2026). Bukan izin kerja, sertifikat, atau pengganti persetujuan HSE/operasi Pertamina. Instalasi permanen di area berbahaya tetap menunggu gate keselamatan & sertifikasi terkait.
