

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

LAPORAN INTERNAL

Laporan Status Proyek GLD Tahap 2

Progres, Sertifikasi ATEX/IECEX, Termin Pembayaran, dan Timeline Kegiatan — per 30 September 2026

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/LAP-STATUS/2026-001
Revisi	1.0
Tanggal	30 September 2026
Periode laporan	20 April 2026 – 30 September 2026
Ditujukan kepada	Manajemen PT LAPI Ganesha Utama — pelaporan anggaran operasional
Proyek	Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 — PT Pertamina Patra Niaga (pilot RU IV Cilacap)
Klasifikasi	Internal — Konfidensial

Daftar Isi

- 1. Ringkasan Eksekutif
- 2. Progres Proyek & Kurva-S
- 3. Sertifikasi ATEX/IECEX
- 4. Status Termin Pembayaran
- 5. Persiapan Instalasi RU IV Cilacap
- 6. Timeline Progres Harian
- 7. Risiko & Keputusan yang Diperlukan
- 8. Daftar Lampiran

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merangkum posisi proyek GLD Tahap 2 per 30 September 2026 untuk keperluan pelaporan anggaran operasional LGU. Proyek berjalan pada dua jalur paralel dengan metrik yang berbeda — jalur rekayasa/lapangan (Kurva-S proyek 9 bulan) dan jalur sertifikasi ATEX/IECEX — ditambah dua milestone pembayaran Termin 1 yang dinilai terpisah oleh Pertamina.


PROGRES REKAYASA/LAPANGAN	KESIAPAN DOKUMEN SERTIFIKASI	TERMIN 1 FIELD TESTING (20%)	TERMIN 1 SERTIFIKASI (40%)
49% vs rencana 62% (-13 poin)	≈43% 21 item checklist, berbobot	Layak tinggal pengesahan & BAST	Belum butuh uji + witness + BA

Poin utama:

- Progres rekayasa/lapangan 49% tidak bergerak sejak 17 September, sementara baseline rencana naik ke 62% pada akhir September. Selisih -13 poin berasal dari pekerjaan yang kini tertahan gate eksternal (instalasi RU IV menunggu penugasan vendor, TRA/JSA, dan klasifikasi area oleh Pertamina), bukan dari rekayasa yang melambat.
- Aplikasi sertifikasi ATEX sudah dikirim ke GTS (agen sertifikasi) sekitar 29 September dengan Applicant dan Manufacturer PT Galaksi Megatama Indonesia, marking usulan II 2G Ex db IIC T4 Gb. Proses berlanjut melalui putaran iterasi dari GTS.
- Data pengukuran suhu pertama (30 September) memberi indikasi positif untuk kelas suhu T4: kasus terburuk ≈114°C pada ambient +60°C, di bawah batas efektif 130°C.
- Termin 1 sertifikasi (40%) belum dapat diajukan hanya dengan kelengkapan dokumen — kontrak mensyaratkan uji prototipe internal yang disaksikan Pertamina dan berita acara, sebelum sampel dikirim ke laboratorium.

2. Progres Proyek & Kurva-S

Baseline Kurva-S dikalibrasi ke Project Timeline 9 bulan pada Deck Kick-Off (12 Juni 2026 – Februari 2027, 12 aktivitas). Progres aktual adalah rata-rata status 12 aktivitas Gantt; assessment terakhir 17 September 2026 (49%) dan dikonfirmasi tetap valid per 30 September karena tidak ada aktivitas Gantt yang bergerak sejak itu.

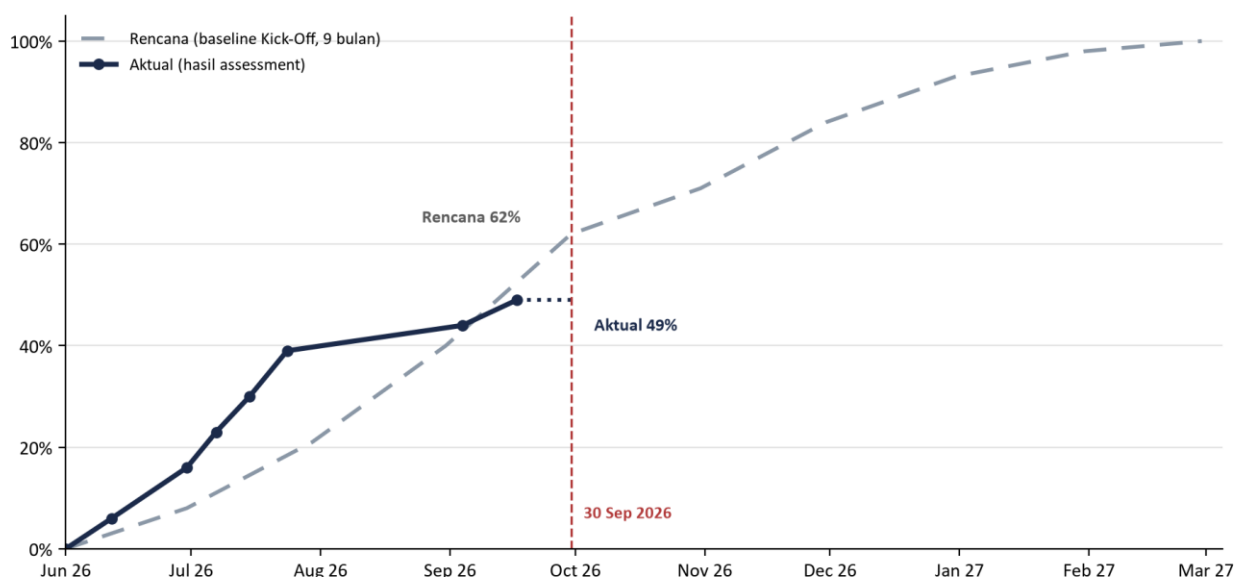

Gambar 1. Kurva-S proyek — rencana vs aktual, per 30 September 2026.

Tanggal	Aktual	Rencana	Selisih	Catatan
24 Jul 2026	39%	19%	+20	Rekayasa lab mendahului jadwal
4 Sep 2026	44%	43%	+1	Pekerjaan mulai bergantung gate eksternal
17 Sep 2026	49%	52%	-3	Assessment terakhir
30 Sep 2026	49%	62%	-13	Rencana naik (integration test & HSE/permit), aktual tertahan gate

Status 12 aktivitas Gantt:

#	Aktivitas	Jadwal rencana	Progres	Status
1	Kick-off & konfirmasi requirement	8–15 Jun	100%	Selesai
2	Site survey & rencana pengambilan data	15 Jun – 7 Jul	75%	Sebagian — survey RU IV selesai 9–10 Agu
3	Detailed design	1–21 Jul	92%	Hampir selesai
4	Prototype build	15 Jul – 21 Agu	68%	Berjalan
5	Lab test	15 Agu – 21 Sep	65%	Berjalan
6	AI model training / validation	15 Agu – 21 Sep	85%	Berjalan
7	Integration test (fungsional)	1 Jul – 7 Okt	80%	Berjalan
8	HSE review & permit preparation	1–14 Nov	22%	Menunggu proses RU IV
9	Field installation	15 Nov – 7 Des	0%	Belum mulai
10	Field trial	8 Des – 7 Jan	0%	Belum mulai
11	Evaluation & final report	1–21 Jan	0%	Belum mulai
12	Industrialization roadmap	8–21 Feb	5%	Awal

3. Sertifikasi ATEX/IECEx

3.1 Kesiapan dokumen (checklist ExCB)

Kesiapan dihitung dari 21 item checklist resmi (Bagian 1.1–1.5, 2.1–2.5, 2.6.a–i, 3.1–3.2) dengan bobot Final 100%, Sebagian 50%, Belum 0%: 5 Final, 8 Sebagian, 8 Belum → $(5 \times 100 + 8 \times 50) \div 21 \approx 43\%$. Angka ini mengukur kelengkapan dokumen, bukan waktu menuju sertifikat terbit.

Bagian	Final	Sebagian	Belum	Keterangan
1. Informasi dasar (1.1–1.5)	0	3	2	Legalitas & fasilitas PT Galaksi sebagian; ISO 9001 audit Okt 2026
2.1–2.5 Deskripsi & klasifikasi	5	0	0	Lengkap; klasifikasi masih usulan tim
2.6.a–i Desain & manufaktur	0	4	5	Gambar, BOM, instruksi, suhu sebagian; material, proses, kalkulasi, nameplate, sertifikat komponen belum
3. Sampel (3.1–3.2)	0	1	1	S/N sampel GLD2-0x1001 kini ditetapkan tim
Total	5	8	8	$\approx 43\%$

3.2 Pengajuan ke GTS

GTS (Shanghai Global Testing Services) adalah agen sertifikasi yang meneruskan aplikasi ke badan sertifikasi dan laboratorium terakreditasi. Berkas yang dikirim sekitar 29 September 2026:

Item	Isi
Formulir aplikasi ATEX (A0)	Applicant & Manufacturer PT Galaksi Megatama Indonesia; kontak Antonius Prasetyo (Director)
Marking usulan	II 2G Ex db IIC T4 Gb — Ex d (flameproof), Group II, IIC, Category 2G/Zone 1, IP66, stationary
Rating & fisik	24 VDC, ≈0,33 A, 8 W; 200 × 90 × 290 mm; 2,378 kg
Dossier teknis	IECEX/ATEX Certification Information Requirements Rev 25 Sep 2026 (60 halaman, disusun tim)

Untuk iterasi berikutnya. Dossier yang terkirim masih memuat beberapa inkonsistensi yang perlu dibetulkan pada putaran iterasi berikutnya dari GTS: suhu ambient tertulis campuran $-20/+60^{\circ}\text{C}$, $-20/+85^{\circ}\text{C}$, dan $-40/+85^{\circ}\text{C}$ (nilai proyek: $-20/+60^{\circ}\text{C}$); marking debu "Ex tb IIIC" pada bagian nameplate (di luar scope gas); cable entry PG13.5 (dokumen teknis: M20×1,5); dan konsep proteksi yang masih tertulis "to be confirmed".

3.3 Hasil pengukuran suhu (indikasi kelas suhu T4)

Pengukuran internal 30 September: 8 kanal thermocouple, 3 kondisi, masing-masing 180 menit pada ambient $\approx 24\text{--}25^{\circ}\text{C}$, diproyeksikan ke ambient maksimum $+60^{\circ}\text{C}$.

Kondisi	Body sensor MQ	PCB	Enclosure luar
Normal	44,2 → $\approx 79^{\circ}\text{C}$	52,4 → $\approx 88^{\circ}\text{C}$	32,1 → $\approx 67^{\circ}\text{C}$
Beban maksimum	55,0 → $\approx 91^{\circ}\text{C}$	58,3 → $\approx 94^{\circ}\text{C}$	34,8 → $\approx 71^{\circ}\text{C}$
Fan mati (malfungsi)	78,4 → $\approx 114^{\circ}\text{C}$	63,4 → $\approx 99^{\circ}\text{C}$	43,9 → $\approx 79^{\circ}\text{C}$

Batas T4 135°C dikurangi margin 5 K (IEC 60079-0) = 130°C . Kasus terburuk $\approx 114^{\circ}\text{C}$ → margin ± 16 K. Masih terbuka: DC/DC converter, inductor, dan MOSFET belum diukur; kondisi alarm/Tx belum diukur; PCB pada beban maksimum belum stabil; metadata uji belum lengkap. Perhatian: bila suhu ambient $+85^{\circ}\text{C}$ (nilai keliru di dossier) yang dipakai penilai, body sensor saat fan mati diproyeksikan $\approx 139^{\circ}\text{C}$ dan melewati batas.

4. Status Termin Pembayaran

4.1 Termin 1 Field Testing (20%)

Dinilai layak diajukan berdasarkan audit 11 September 2026: detail engineering, kesiapan 4 GLD dan 16 Cluster Head, konfigurasi firmware, integrasi GLD—CH—Gateway—Server, mesh/failover, dan alarm push sudah terdokumentasi. Sisa langkah administratif: pengesahan laporan dan BAST (draft tersedia). Instalasi, commissioning, dan as-built masuk termin lapangan berikutnya. Status pengajuan/pembayaran belum tercatat dalam laporan ini.

4.2 Termin 1 Sertifikasi (40%)

Termin ini bukan milestone kelengkapan dokumen. Kontrak mensyaratkan prototipe diuji internal, hasil uji memicu iterasi desain, disaksikan dan divalidasi Pertamina, dilakukan sebelum uji laboratorium terakreditasi, dan dituangkan dalam berita acara. Status per 30 September:

#	Syarat	Status	Bukti / kekurangan
1	Prototipe enclosure tersedia	Sebagian (membaik)	Unit terakit & terfoto; S/N GLD2-0x1001 ditetapkan; lembar identifikasi sampel belum ditandatangani
2	Prototipe diuji (mekanik/termal/sealing/fault)	Sebagian	Uji termal internal 30 Sep; uji mekanik, sealing, fault belum
3	Iterasi desain berbasis hasil uji	Belum	Kandidat: antena dipindah ke atas base — belum dikaitkan dengan temuan uji
4	Disaksikan & divalidasi Pertamina	Belum	Belum ada sesi witness uji enclosure
5	Selesai sebelum uji lab terakreditasi	Tersedia	Sampel belum dikirim ke lab — sesi witness harus terjadi sebelum pengiriman
6	Berita acara	Belum	Template tersedia; menunggu data uji yang disaksikan
7	Laporan pekerjaan	Tersedia	Laporan 15 Sep; perlu diperbarui setelah uji & witness

Rekomendasi. Langkah tercepat: jadwalkan satu sesi uji internal yang disaksikan Pertamina — ulang uji termal dengan titik DC/DC, inductor, MOSFET; tambah pemeriksaan mekanik/dimensi dan uji sealing sederhana — lalu tuangkan dalam berita acara, sebelum sampel dikirim melalui GTS.

5. Persiapan Instalasi RU IV Cilacap

Arah kerja: uji chamber gas di kantor kilang (non-area proses) dan instalasi permanen di lokasi non-ATEX, yaitu perimeter Sulfur Recovery Unit. Eksekusi fisik oleh vendor yang ditunjuk Pertamina; LGU berperan sebagai basis desain, supervisi teknis/QA, dan pekerjaan elektrik spesifik GLD.

Tahap	Status
Survey lokasi	Selesai (9–10 Agustus 2026)
Basis desain bracket U-bolt (CAD) & dokumen persiapan	Selesai — diteruskan ke grup Pertamina 30 Sep
Kesiapan sisi LGU & ITB (Kurva-S persiapan instalasi)	Selesai — 100% (keseluruhan 38%)
Penugasan resmi vendor instalasi	Menunggu proses RU IV
Pengesahan TRA/JSA & izin kerja	Menunggu proses RU IV
Dokumen klasifikasi area perimeter SRU	Menunggu proses RU IV
Rapat koordinasi persiapan (29 Sep)	Selesai — 4 keputusan diajukan
Instalasi fisik & commissioning	Belum mulai

6. Timeline Progres Harian

Kronologi kegiatan dan milestone proyek dari awal fase lab hingga 30 September 2026. Rentang tanggal dipakai untuk periode kerja mingguan fase awal.

Tanggal	Kegiatan / milestone	Kategori
FASE 1 — LAB (20 APR – 7 JUN 2026)		
20–26 Apr	Desain chamber gas; uji node GLD lama; uji routing Cluster Head.	Engineering
27 Apr – 3 Mei	Uji node GLD baru #0001/#0002 (ADC 8 kanal, LoRa); uji baterai CH.	Engineering
4–10 Mei	Uji fungsional dimulai; uji solar ke CH; firmware CH power-recovery guard + watchdog.	Engineering
11–17 Mei	Uji jarak & reliabilitas LoRa; profil konsumsi baterai node.	Engineering
18–31 Mei	Uji sistem se-kampus; Site Survey Technical Checklist; topologi star-mesh & failover CH terbukti.	Milestone
1–7 Jun	Persiapan pemasangan; uji RF LoRa (100 m, PDR 100%).	Engineering

Tanggal	Kegiatan / milestone	Kategori
FASE 2 — KICK-OFF & MENUJU LAPANGAN (JUN – JUL 2026)		
12 Jun	Kick-Off dengan Pertamina — baseline 9 bulan, scope 6 Refinery Unit.	Milestone
18 Jun	Prinsip AI fingerprint 8-sensor ditetapkan; target TRL-7.	Engineering
26 Jun	Uji antena LoRa; pengembangan model TCN dimulai.	Engineering
30 Jun	Project Report Juni: PCB v1/v2 selesai; progres chamber & dataset.	Laporan
6–8 Jul	Uji 2 Cluster Head; uji baterai CH ±40 jam; uji lapangan CH3 8 hari.	Engineering
9 Jul	Rantai komunikasi GLD–CH–Gateway–Server tersambung (MQTT).	Milestone
15 Jul	Dataset 14.477 sampel; model TCN 8 sensor akurasi ≥92%.	Milestone
16 Jul	Uji fungsional end-to-end; analisis daya; uji mesh 8-CH multi-hop se-kampus.	Milestone
23 Jul	Repo server aktif (firmware, Operator Hub, nulling); sistem kendali chamber gas berbasis ESP32.	Engineering
24 Jul	Rapat LGU–Pertamina: versi 24 VDC siap sertifikasi; 18 action item.	Rapat
30 Jul	Rapat mingguan: kunjungan Cilacap dimajukan ke 9–10 Agustus; arsitektur aplikasi lokal.	Rapat
FASE 3 — SURVEY & DOKUMENTASI (AGU 2026)		
6 Agu	Rapat resmi instalasi & mounting di Lab IoT ITB — bracket tanpa bor/las; requirement gas Benzena/CO/H2S.	Rapat
6–8 Agu	Demo mesh Gateway + 3 CH; push alarm otomatis berhasil diuji.	Milestone
9 Agu	Model CNN Dual-Branch ditetapkan sebagai model AI resmi (99,20% on-chip).	Milestone
9–10 Agu	Kunjungan RU IV Cilacap — survey lokasi selesai.	Milestone
19 Agu	Datasheet Sistem konsolidasi; inferensi AI on-device dikonfirmasi; catu daya 24 VDC final.	Dokumen
31 Agu	Desain CAD bracket U-bolt v2; laporan progres 20 Apr – 31 Agu difinalisasi.	Dokumen
FASE 4 — SERTIFIKASI & PERSIAPAN INSTALASI (SEP 2026)		
4 Sep	Proposal formal direkonsiliasi; presentasi progres untuk VP Pertamina; 6 gate integrasi ditutup; Kurva-S 44%.	Laporan
5 Sep	Dashboard sertifikasi; target Zona 1 / 2G / T4 dan usulan grup gas IIC.	Sertifikasi
10 Sep	Checklist kesiapan instalasi 3 jalur; audit kesiapan Termin 1.	Dokumen
11 Sep	Dokumen teknis sertifikasi (bahasa Inggris, format korporat) dimulai; laporan Termin 1 Field Testing.	Sertifikasi
15 Sep	Laporan pemenuhan Termin 1 Sertifikasi (40%).	Laporan
17 Sep	Uji awal ketahanan RF terhadap interferensi; Bagian 1 checklist ExCB; lokasi instalasi permanen: perimeter SRU; Kurva-S 49%.	Milestone
18 Sep	Kurva-S persiapan instalasi (38%) atas permintaan Pertamina.	Laporan
22 Sep	Instruction Manual GLD; PT Galaksi Megatama Indonesia teridentifikasi sebagai manufacturer; spesifikasi IP66 & cable gland.	Sertifikasi
23 Sep	Formulir aplikasi ATEX dari GTS diterima.	Sertifikasi
24 Sep	Spesifikasi final: suhu operasi –20/+60°C, kelembapan 5–95% RH, berat 2,378 kg.	Sertifikasi
25 Sep	Material mesh (stainless) & gasket (karet) dikonfirmasi; batas kelistrikan 24 VDC; dossier tim Rev 25 Sep.	Sertifikasi
28 Sep	Metode proteksi Ex d dipilih (usulan tim); Applicant = PT Galaksi; bahan rapat Pertamina disiapkan.	Sertifikasi
29 Sep	Aplikasi & dossier dikirim ke GTS; rapat koordinasi persiapan instalasi dengan Pertamina.	Milestone
30 Sep	Data pengukuran suhu pertama (indikasi T4 positif); dokumen persiapan instalasi diteruskan ke Pertamina; audit progres.	Milestone

7. Risiko & Keputusan yang Diperlukan

Risiko / isu	Dampak	Tindak lanjut	Pihak
Instalasi RU IV tertahan (vendor, TRA/JSA, klasifikasi area)	Deviasi Kurva-S melebar; termin lapangan tertunda	Kawal 4 keputusan rapat 29 Sep	Pertamina RU IV
Termin 1 sertifikasi belum memenuhi syarat uji & witness	Pembayaran 40% tertunda	Jadwalkan sesi uji disaksikan Pertamina + berita acara	LGU & Pertamina
Urutan Termin 1: sampel terkirim sebelum witness	Syarat 5 gugur	Tahan pengiriman sampel sampai witness selesai	LGU
Inkonsistensi dossier di GTS (Tamb, marking debu, cable entry)	Penilaian T4 bisa memakai +85°C → gagal	Betulkan pada iterasi GTS berikutnya	Tim sertifikasi
Titik panas belum lengkap diukur	Kelas suhu belum terverifikasi penuh	Ukur DC/DC, inductor, MOSFET, kondisi alarm/Tx	Tim teknis
Sampel gas tambahan (H2S, dll.) belum tersedia	Kapabilitas gas tambahan tertunda	Chamber on-site di kilang; pengadaan paralel	Pertamina & LGU

Keputusan yang diminta dari manajemen LGU:

- Persetujuan jadwal dan anggaran sesi uji internal yang disaksikan Pertamina (Termin 1 sertifikasi).
- Penunjukan PIC yang mengawal umpan balik iterasi dari GTS dan penyelarasan dossier.
- Penegasan penandatanganan resmi (authorized signatory) di pihak PT Galaksi untuk formulir aplikasi.
- Eskalasi ke Pertamina atas item yang menunggu proses RU IV (vendor, TRA/JSA, klasifikasi area).

8. Daftar Lampiran

No	Dokumen	Keterangan
01	Kurva-S Persiapan Instalasi RU IV Cilacap	KPI 3 pihak, 40 item persiapan
02	Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap	Matriks LGU & ITB / Pertamina / Vendor
03	Materi Rapat Koordinasi 29 September 2026	Slide presentasi rapat dengan Pertamina
04	Laporan Termin 1 Field Testing (20%) Rev02	Beserta draf BAST (05)
06	Laporan Termin 1 Sertifikasi (40%)	Status per 15 Sep — diperbarui oleh Bagian 4.2
07	Dokumen Teknis Sertifikasi IECEx/ATEX Rev 1.4	Dokumen teknis lengkap, bahasa Inggris
08–09	Berkas yang dikirim ke GTS	Formulir aplikasi & dossier tim
10	Data Pengukuran Temperatur MQ	Data mentah uji suhu 30 Sep
