




Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Sertifikasi

Program Sertifikasi Hazardous Area (ATEX/IECEX)
Gas Leak Detector — GLD Tahap 2

Laporan Termin 1
Sertifikasi ATEX/IECEX (40%)



PT LAPI GANESHA UTAMA

PT. LAPI GANESHA UTAMA
Jl. Dederuk No. 30
Bandung 40133
Telp. 022 - 2507463
Fax. 022 - 2502636

Email : office@lapiganeshatama.co.id
www.lapiganeshatama.co.id

	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Sertifikasi		
No. Kontrak:	Dokumen	Rev	Jml. Hal
	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1	0.2	14
	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Sertifikasi Program Sertifikasi Hazardous Area (ATEX/IECEX) Gas Leak Detector — GLD Tahap 2 2026		
Date	Revision	Prepared by	Approved by
2 Oktober 2026	Rev 0.2	LGU	

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Sertifikasi Program Sertifikasi Hazardous Area (ATEX/IECEX) Gas Leak Detector — GLD Tahap 2

Dikerjakan oleh,
PT LAPI Ganesha Utama

Untuk
PT Pertamina Patra Niaga

Bandung, Oktober 2026

Team Leader,

Direktur Utama,

Dr. Maman Budiman

Ir. Harry Fardiman

**Manager Domestic Product Content & Digitalization
PT Pertamina Patra Niaga**

Agustinus Pindoan Panjaitan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 Program Sertifikasi Hazardous Area (ATEX/IECEX) Gas Leak Detector — GLD Tahap 2 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai materi evaluasi Termin 1 sebesar 40 persen. Laporan menyajikan bukti pemenuhan untuk setiap syarat kontraktual Termin 1, register bukti, serta dokumen yang masih dalam penyiapan, secara apa adanya. Penilaian pemenuhan dan keputusan pembayaran sepenuhnya merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga.

Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Kami terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan pekerjaan pada tahap berikutnya.

Bandung, Oktober 2026

PT LAPI Ganesha Utama

Dr. Maman Budiman

Team Leader

DAFTAR ISI

1 Ringkasan	2
2 Dasar Kontraktual	3
3 Matriks Bukti Pemenuhan per Syarat	4
3.1 Prototipe enclosure GLD tersedia — SEBAGIAN	4
3.2 Prototipe telah diuji — SEBAGIAN	4
3.3 Ada iterasi perbaikan desain berbasis hasil uji — SEBAGIAN	4
3.4 Disaksikan dan divalidasi Pertamina — DALAM PENYIAPAN	5
3.5 Selesai sebelum uji laboratorium terakreditasi — TERSEDIA	5
3.6 Berita acara — DALAM PENYIAPAN	5
3.7 Laporan pekerjaan Termin 1 — TERSEDIA	5
4 Progres Program Sertifikasi Secara Keseluruhan	7
5 Register Bukti	8
6 Dokumen Tahap Lanjutan	8
7 Penutup	9
8 Lembar Evaluasi	9

Nomor halaman mengikuti nomor "Halaman" pada laporan.

LAPORAN PEMENUHAN DELIVERABLE TERMIN 1

Program Sertifikasi Hazardous Area (ATEX / IECEx) Gas Leak Detector
— GLD Tahap 2

MATERI EVALUASI TERMIN 1 SEBESAR 40 PERSEN

Nomor dokumen	LGU-GLD-T1-CERT-2026-001
Revisi	0.2
Tanggal	2 Oktober 2026
Status	Untuk evaluasi PT Pertamina Patra Niaga
Disiapkan oleh	LAPI Ganesha Utama bersama Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga

CATATAN SIFAT DOKUMEN

Laporan ini menyajikan seluruh bukti pemenuhan dan pekerjaan lanjutan terhadap syarat Termin 1 sertifikasi apa adanya. Penilaian pemenuhan dan keputusan kesiapan pembayaran sepenuhnya merupakan evaluasi PT Pertamina Patra Niaga.

1 Ringkasan

Tujuan laporan. Dokumen ini menyampaikan status pemenuhan syarat Termin 1 pada skema pembayaran dua termin proyek sertifikasi ATEX/IECEX Gas Leak Detector (GLD, Node Sensor) — Termin 1 sebesar 40 persen dari nilai SPK sertifikasi. Laporan menampilkan seluruh bukti yang tersedia di sisi tim pengembang serta pekerjaan lanjutan yang sedang disiapkan terhadap syarat kontraktual, tanpa menyimpulkan sendiri layak atau tidaknya pengajuan — keputusan tersebut diserahkan kepada evaluasi PT Pertamina Patra Niaga.

Konteks proyek. Program sertifikasi mencakup 4 jalur paralel — ATEX (Directive 2014/34/EU, Kategori 2G Zona 1), IP66/67 (IEC 60529), EMC (EN 61000-6-2/-4), dan RF (ETSI/SDPPI) — untuk perangkat GLD (Node Sensor) saja; Cluster Head dan Gateway berada di luar lingkup proyek sertifikasi maupun RAB. Proyek aktif sejak Kick-Off 12 Juni 2026 dengan estimasi durasi keseluruhan 5 sampai 8 bulan menuju uji laboratorium terakreditasi internasional.

No	Syarat Termin 1	Status	Ringkasan bukti dan tindak lanjut
1	Prototipe enclosure GLD tersedia	SEBAGIAN	Unit fisik terakit dan terfoto; nomor seri sampel GLD2-0x1001 telah ditetapkan pada formulir aplikasi; lembar identifikasi sampel bertanda tangan sedang disiapkan.
2	Prototipe telah diuji (mekanik/termal/sealing/fault)	SEBAGIAN	Uji termal internal 30 Sep 2026 telah dilaksanakan (8 titik thermocouple, 3 kondisi beban, 180 menit); uji mekanik, sealing/IP pra-uji, dan fault condition sedang disiapkan.
3	Ada iterasi perbaikan desain berbasis hasil uji	SEBAGIAN	Iterasi desain tersedia: PCB Node Sensor GLD lima versi (V1–V5) dengan catatan perubahan per versi, termasuk perbaikan temuan V2 pada V3, dan casing berkembang dari ATEX Casing v2 ke v3 (8 Sep 2026). Log keterkaitan revisi dengan temuan uji sedang dirangkum.
4	Disaksikan dan divalidasi Pertamina	DALAM PENYIAPAN	Witness sheet/berita acara khusus uji enclosure dijadwalkan bersama Pertamina; kunjungan yang ada bersifat pembahasan desain.
5	Urutan sebelum uji lab terakreditasi	TERSEDIA	Formulir aplikasi dan dossier teknis telah diajukan ke GTS (agen sertifikasi) sekitar 29 Sep 2026; pengujian di laboratorium terakreditasi dilakukan sesudah tahap ini, sehingga urutan tahap terjaga.
6	Berita acara	DALAM PENYIAPAN	Notulen rapat tersedia; berita acara validasi hasil uji disiapkan setelah sesi witness.
7	Laporan pekerjaan Termin 1	TERSEDIA	Laporan ini adalah laporan pekerjaan yang dimaksud, disusun dari seluruh bukti pekerjaan per 2 Oktober 2026.

2 Dasar Kontraktual

Termin 1 pada skema pembayaran dua termin proyek sertifikasi bernilai 40 persen dari harga SPK sertifikasi. Milestone ini disyaratkan tercapai apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi: (1) tersedia prototipe enclosure gas leak detector; (2) prototipe telah diuji; (3) hasil pengujian menghasilkan atau menutup iterasi perbaikan desain; (4) pengujian dan hasil iterasi disaksikan serta divalidasi oleh Pertamina; (5) tahap tersebut selesai sebelum pengujian dan sertifikasi di laboratorium terakreditasi internasional; dan (6) pelaksanaan dituangkan dalam berita acara dan laporan pekerjaan.

Termin ini berbeda dari Termin 1 pada SPK field testing (20 persen) yang dinilai pada laporan terpisah (Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 Field Testing, Rev 0.2). Keduanya berjalan pada dua SPK/jalur kerja yang berbeda — sertifikasi hazardous area versus pilot/field testing sistem — sehingga bukti pemenuhannya juga dievaluasi terpisah.

3 Matriks Bukti Pemenuhan per Syarat

Bagian ini merinci bukti yang ditemukan dan tindak lanjut untuk setiap syarat pada Bagian 2, berdasarkan status pekerjaan per 2 Oktober 2026.

3.1 Prototipe enclosure GLD tersedia — SEBAGIAN

Bukti yang ditemukan. Tujuh foto perakitan prototipe, tiga di antaranya menunjukkan urutan perakitan motherboard, pemasangan delapan sensor, hingga unit terakit lengkap (metadata foto utama tercatat 26 Agustus 2026). Desain mekanik pendukung tersedia pada gambar CAD ATEX Casing v2 (STEP/OBJ) dan desain bracket U-bolt.

Identitas unit/nomor seri, revisi desain, konfigurasi hardware-firmware yang terkunci, kondisi siap-uji, dan lembar identifikasi sampel yang ditandatangani sedang disiapkan.

3.2 Prototipe telah diuji — SEBAGIAN


Bukti yang ditemukan. Bukti pengujian fungsi sistem, dataset gas, komunikasi LoRa, dan chamber gas tersedia dan menunjukkan kematangan fungsi sistem secara umum. Proposal sertifikasi formal juga sudah menetapkan jenis pre-compliance test yang direncanakan. Uji termal internal telah dilaksanakan pada 30 September 2026: 8 titik thermocouple pada kondisi normal, beban maksimum, dan kipas mati selama 180 menit. Ekstrapolasi ke suhu ambien +60 °C memberikan suhu titik terpanas ± 114 °C, di bawah batas efektif kelas suhu T4 (130 °C).

Uji lanjutan khusus enclosure sedang disiapkan: inspeksi mekanik/dimensi, pelengkapan titik ukur termal, simulasi sealing atau IP pra-uji, maupun uji fault condition. Hasil uji termal internal akan dilengkapi dan disaksikan dalam sesi uji bersama Pertamina.

3.3 Ada iterasi perbaikan desain berbasis hasil uji — SEBAGIAN

Bukti yang ditemukan. Iterasi desain perangkat keras telah dilakukan pada dua komponen utama. (1) PCB Node Sensor GLD telah melalui lima versi dengan catatan perubahan per versi (Gambar 3.3): V1 sebagai baseline — ESP32, ADC ADS1256, multiplexer TCA9548, DAC MCP4725, jalur analog INA333/OPA333/LM321, dan bridge sensor MQ berada pada satu motherboard; V2 memindahkan INA333, MCP4725, dan bridge MQ ke SensorBoardMQ terpisah dengan saklar daya TPS22919, mengganti LM321 dengan OPA320, serta menambahkan PCF8574 dan sensor suhu-kelembapan SHT40; V3 memperbaiki temuan pada V2 — jalur catu +5VA disambungkan dan soket kipas DC 5 V dikembalikan; V4 menambahkan cover PCB dengan terminal kabel serta lubang baut untuk pemasangan motherboard; V5 memisahkan fungsi akuisisi (ADS1256, TCA9548, OPA320, PCF8574, SHT40, +5VA) ke Sensor PCB yang terhubung melalui konektor 16-pin PHD2.0, sementara motherboard adapter mempertahankan ESP32 dan watchdog TPL5010. Dokumentasi BOM dan layout PCB tersedia per 9–11 September 2026; (2) casing berkembang dari ATEX Casing v2 (desain mounting U-bolt) ke GLD ATEX Case v3 (8 September 2026) dengan mesh filter stainless steel, kipas DC, dan dimensi yang disesuaikan untuk kebutuhan sertifikasi Ex d.

Catatan perubahan per versi PCB telah tersedia. Penautan setiap revisi dengan temuan uji, tindakan koreksi, dan hasil uji ulang (termasuk hasil uji termal 30 September 2026) sedang dirangkum.

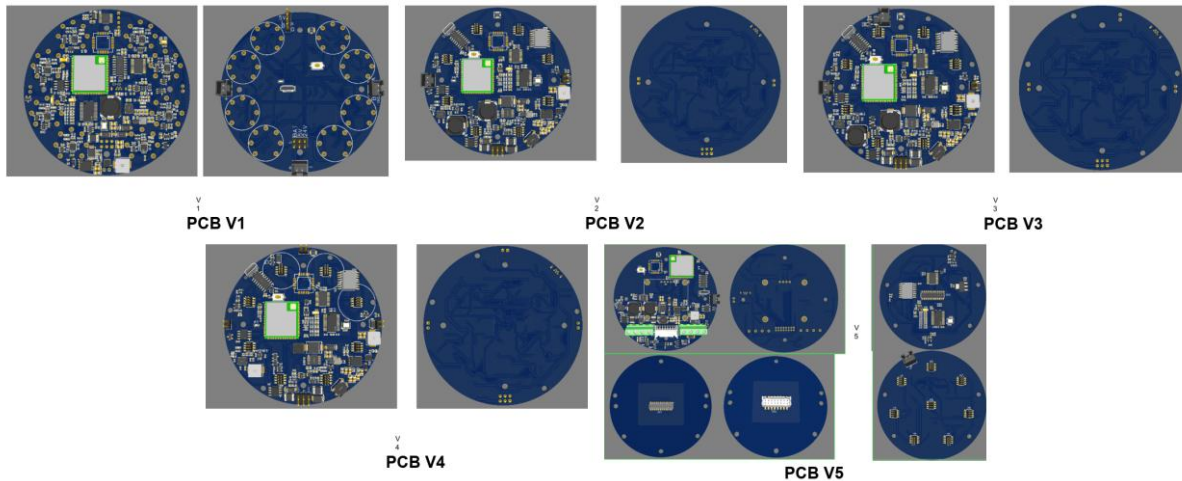

Gambar 3.3 Iterasi PCB Node Sensor GLD, versi V1 hingga V5 (tampak atas dan bawah)

3.4 Disaksikan dan divalidasi Pertamina — DALAM PENYIAPAN

Bukti yang ditemukan. Notulen 6 Agustus 2026 (Lab IoT ITB) dan notulen kunjungan RU IV Cilacap menunjukkan keterlibatan aktif Pertamina dalam pembahasan desain, pemasangan, dan arah sertifikasi.

Kunjungan tersebut adalah forum pembahasan desain dan progres, bukan witness uji enclosure. Dokumen witness sheet, daftar hadir sesi uji enclosure, pernyataan hasil diterima/ditolak, catatan komentar dan status penutupannya, serta tanda tangan pejabat/perwakilan Pertamina untuk validasi khusus ini disiapkan bersama Pertamina.

3.5 Selesai sebelum uji laboratorium terakreditasi — TERSEDIA

Bukti yang ditemukan. Formulir aplikasi ATEX dan dossier teknis telah diajukan ke GTS (agen sertifikasi) sekitar 29 September 2026; pengiriman sampel ke laboratorium terakreditasi dilakukan setelah tahap ini.

Sesi pre-compliance dan witness (Syarat 2–4) tetap perlu dijadwalkan dan ditutup sebelum sampel benar-benar dikirim, agar urutan tahap ini tidak terlanggar saat proses berlanjut.

3.6 Berita acara — DALAM PENYIAPAN

Bukti yang ditemukan. Notulen rapat (12 Juni, 6 Agustus, kunjungan RU IV) tersedia sebagai rekaman diskusi.

Notulen pembahasan bukan berita acara validasi hasil uji. Diperlukan berita acara khusus dengan hasil keputusan eksplisit, lampiran bukti uji, dan tanda tangan para pihak. Template kerja telah tersedia dan diisi setelah data uji pendasarnya tersedia.

3.7 Laporan pekerjaan Termin 1 — TERSEDIA

Bukti yang ditemukan. Dokumen ini disusun sebagai laporan pekerjaan Termin 1 sertifikasi, merangkum seluruh bukti dan tindak lanjut di atas beserta register bukti pada Bagian 5.

Laporan ini melaporkan status apa adanya; ia tidak dapat menggantikan bukti uji, witness, maupun berita acara yang secara kontraktual disyaratkan pada Syarat 2 sampai 4 dan 6.




Gambar 1 Unit GLD terakit dengan enclosure, sensor cartridge, antena, dan modul alarm (dokumentasi 26 Agustus 2026)

4 Progres Program Sertifikasi Secara Keseluruhan

Sebagai konteks tambahan di luar syarat kontraktual Termin 1, tim pengembang memantau progres program sertifikasi dengan metrik berikut:

Metrik	Nilai	Definisi dan batasan
Kesiapan dokumen sertifikasi (21 butir checklist ExCB, berbobot)	≈ 43% (per 30 September 2026)	Kelengkapan dokumentasi teknis; tidak termasuk pelaksanaan pengujian di laboratorium.
Pengajuan ke agen sertifikasi (GTS)	Diajukan ± 29 September 2026	Formulir aplikasi ATEX + dossier teknis; iterasi dokumen mengikuti tanggapan GTS.
Uji termal internal	Dilaksanakan 30 September 2026	Indikasi positif kelas suhu T4 ($\pm 114\text{ }^{\circ}\text{C}$ vs batas $130\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Metrik ini adalah indikator kemajuan rekayasa dan administrasi internal, bukan pengganti penilaian pemenuhan syarat Termin 1 pada Bagian 2 dan 3. Skema klasifikasi area berbahaya yang ditargetkan proposal — Zona 1, Kategori 2G, Grup II, kelas suhu T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$) — sudah eksplisit; grup gas IIC dan metode proteksi Ex d (flameproof enclosure) telah ditetapkan, dengan penandaan yang diajukan II 2G Ex db IIC T4 Gb.

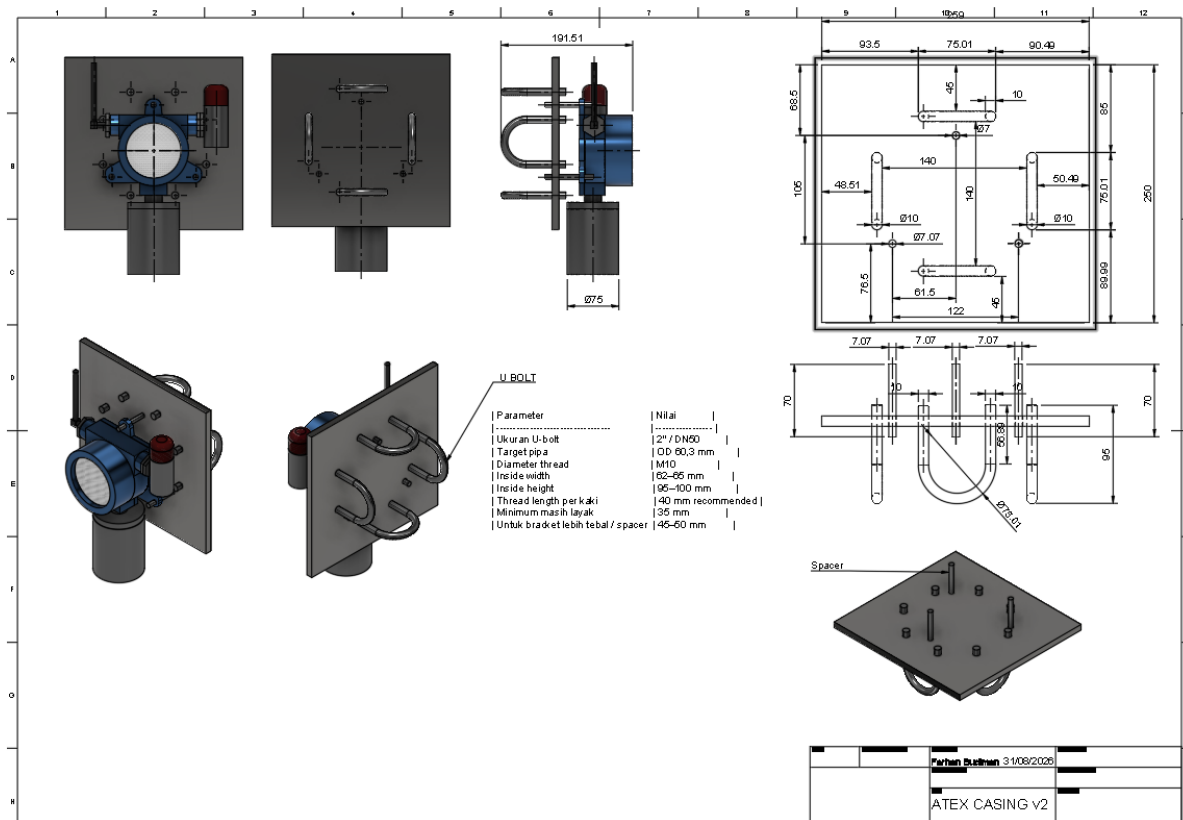

Gambar 2 Basis desain "ATEX Casing v2" dan bracket L / U-bolt untuk mounting GLD

5 Register Bukti

ID	Bukti	Keterangan
E-01	Foto perakitan prototipe GLD (26 Agu 2026)	3 foto urutan perakitan dan 4 foto komponen.
E-02	Desain "ATEX Casing v2" (STEP/OBJ) dan bracket L/U-bolt	Basis desain mekanik enclosure dan mounting.
E-03	Dokumen spesifikasi input dan parameter EMC	Spesifikasi input sertifikasi dan parameter uji EMC.
E-04	Technical Datasheet GasleakDetector Revision 4.0	Spesifikasi fungsional dan teknis perangkat yang menjadi objek sertifikasi.
E-05	Proposal Sertifikasi ATEX/IP/EMC/RF (21 Februari 2026)	Dasar lingkup, target klasifikasi Zona 1/2G/T4, dan rencana pre-compliance test.
E-06	Notulensi Kick-Off Meeting (12 Juni 2026)	Titik mulai proyek sertifikasi dan penyelarasan lingkup awal.
E-07	Notulen Meeting GLD 6 Agustus 2026	Pembahasan desain mekanik dan progres bersama Pertamina di Lab IoT ITB — bukan witness uji enclosure.
E-08	Notulen kunjungan Pertamina RU IV Cilacap	Pembahasan instalasi dan sertifikasi terkait lokasi, bukan witness uji enclosure.
E-09	Dashboard Sertifikasi GLD ATEX/IECEX	Kurva-S dan pemantauan progres 4 jalur sertifikasi.
E-10	Checklist dan analisis kesiapan sertifikasi	Checklist sertifikasi, laporan analisis kesiapan, dan status per butir.
E-11	Rencana kerja Termin 1 dan template kerja	Rencana kerja (10 September 2026) serta template log uji, berita acara, dan laporan pekerjaan.

6 Dokumen Tahap Lanjutan

Daftar berikut adalah dokumen kontraktual Termin 1 yang templatennya sudah tersedia dan diisi setelah data pendasarnya (hasil uji enclosure dan witness) tersedia.

Dokumen	Status berkas	Menunggu
Log Uji dan Iterasi Enclosure	Template tersedia	Menunggu pelaksanaan protokol uji enclosure (mekanik, termal/hotspot, sealing/IP pra-uji, fault condition).
Berita Acara Validasi Prototipe	Template tersedia	Menunggu sesi witness Pertamina atas hasil uji enclosure di atas.
Identitas sampel dan design freeze	Dalam penyiapan	ID sampel, revisi mekanik/PCB/firmware, tanggal rakit, PIC, dan foto enam sisi + internal.

7 Penutup

Laporan ini menyajikan seluruh bukti yang tersedia di sisi tim pengembang serta pekerjaan lanjutan terhadap ketujuh syarat Termin 1 sertifikasi sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 dan 3. Berdasarkan bukti tersebut, LGU mengajukan pembayaran Termin 1 sebesar 40 persen; penilaian pemenuhan syarat dan keputusan tersebut sepenuhnya berada pada evaluasi PT Pertamina Patra Niaga, dengan matriks Bagian 3 sebagai acuan tinjau per syarat.

Apabila PT Pertamina Patra Niaga memerlukan sesi uji dan witness bersama untuk menutup Syarat 2 sampai 4 dan 6, tim pengembang siap menjadwalkan pelaksanaan mengikuti kerangka kerja pada kerangka kerja tim (identitas prototipe, protokol uji, log iterasi, witness, hingga dokumen serah terima).

8 Lembar Evaluasi

Lembar ini disediakan untuk mencatat hasil evaluasi PT Pertamina Patra Niaga atas laporan ini, tanpa mengandaikan hasil evaluasi tersebut.

Peran	Pihak	Pengesahan
Disiapkan oleh	LAPI Ganesha Utama	Nama dan jabatan
		Tanda tangan dan tanggal
Diverifikasi oleh	Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB	Nama dan jabatan
		Tanda tangan dan tanggal
Dievaluasi oleh	PT Pertamina Patra Niaga	Nama dan jabatan
		Tanda tangan dan tanggal

Hasil evaluasi (diisi oleh PT Pertamina Patra Niaga)

- [] Syarat Termin 1 dinilai terpenuhi — diproses untuk pembayaran 40 persen
- [] Syarat Termin 1 dinilai terpenuhi sebagian — diproses dengan catatan/syarat tambahan
- [] Syarat Termin 1 dinilai belum terpenuhi — memerlukan uji dan witness lanjutan sebagaimana Bagian 6
